



Recorrido 360 depto muestra



Facebook Vive Del Bosque



[www.vivetorredelbosque.com](http://www.vivetorredelbosque.com)

(33) 3122 7131

## TRABAJOS EN FACHADA (AGOSTO)



**Fachada Poniente:**  
Aplanados en Fachada: 90% Avance



**Fachada Oriente:**  
Aplanados en Fachada: 90% Avance

## AGOSTO(Avance de Obra)



**Fachada Norte**  
Estructura Terminada al Nivel 25 (Azotea)



**Fachada Sur**  
Estructura Terminada

# FOTOGRAFÍAS PB Y SÓTANOS (AGOSTO)



**Planta Baja**



**Ingreso a Sótano**



**Sótano 1**



**Sótano 3**

# AVANCE FOTOGRÁFICO ALBAÑILERIA



**Nivel 24 Yeso en Muros**



**Nivel 4 Porcelanato en Baños**



## Avance de Obra:

\*Muros de Albañilería

\*Aplanados

\*Yeso

\*Firmes

\*Boquillas

\*Porcelanato:

Pisos:

Baños:

\*Cubo de Elevador:

\*Cubo de Escaleras:

\*Escaleras

**Finalizado**

Detallando

Nivel 24

Detallando

**Finalizado**

Niveles 3 al 14

Nivel 3 y 4

Detallando

Detallando

Detallando



**Nivel 14 Porcelanato en Pisos**

# AVANCE FOTOGRÁFICO TABLAROCA



**Nivel 19 Mestales (Soportes) en Muro**



**Nivel 13 Tablaroca en Muro y Plafón**

## Avance de Obra:

\*Metales en Muros  
\*Tablaroca en Muros

Nivel 19  
Nivel 18

\*Metales y Tablaroca  
en Plafón

Nivel 13

\*Pasta

Nivel 10



**Nivel 10 Colocación de Pasta en Muro y Plafón**

# AVANCE FOTOGRÁFICO INST. ELECTRICA




**Nivel 20 Inst. Eléctricas en Losa**

## Avance de Obra:

- \*Instalaciones en Losa
- \*Instalaciones en Muro
- \*Cableado

- Nivel 22
- Nivel 18
- Nivel 15

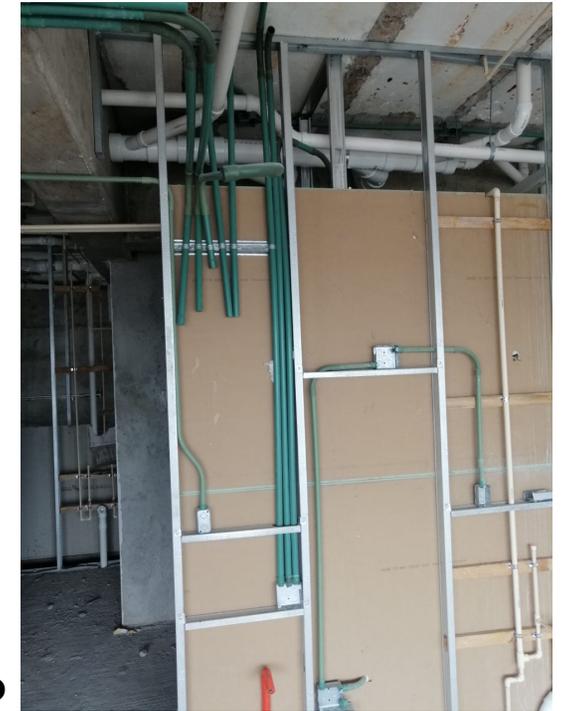

**Nivel 18 Inst.  
Eléctricas en Muro**



**Nivel 15 Cableado (Disparos)**

# AVANCE FOTOGRÁFICO INST. HIDRAULICA



**Nivel 24 Instalación de Gas y Bajante Pluvial**

## **Avance de Obra:**

\*Instalación Hidráulica en Muro y Losa

Nivel 18

\*Instalación Sanitaria

Nivel 18

\*Instalación de Gas:

Nivel 24

\*Bajante Pluvial

Conectado a Azotea



**Nivel 18 Inst. Hidrosanitarias**

# AVANCE FOTOGRÁFICO ALUMINIO Y VIDRIO



**Ventanas y Louvers en Fachadas**

## Avance de Obra:

\*Instalación Ventanas de Proyección y Louvers  
Niveles 3-14, 16 y 20-23

\*Instalación Cancel Corredizo Nivel 03



**Nivel 23 Ventanas y Louver**



**Cancel Corredizo Nivel 3**

# AVANCE FOTOGRÁFICO IMPERMEABILIZACION



**Nivel 19 Imper Vano**



**Nivel 04 Imper Regadera**

## Avance de Obra:

\*Imper. en Boquillas


Niveles 3-14, 16 y 19-23

\*Imper. Terrazas

Niveles 3-7, 9,10 y 12-14

\*Charolas

Niveles 3 y 4

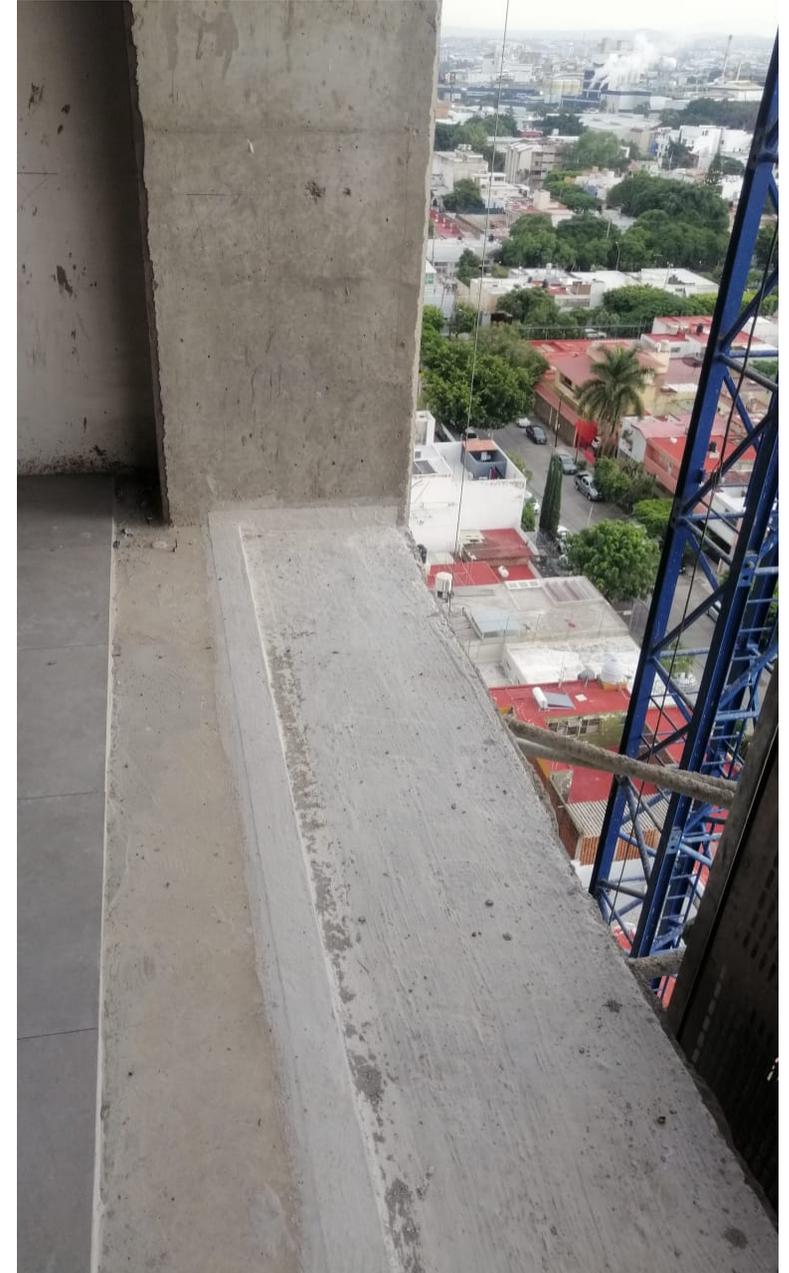

**Nivel 12 Impermeabilizante en Terraza**

# AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 24



PH 01

Nivel 23



Bosque

Nivel 22



Bosque



PH 02



Luna



Luna

# AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 21



Bosque

Nivel 20



Bosque

Nivel 19



Bosque



Luna



Luna



Luna

# AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

**Nivel 18**



**Bosque**

**Nivel 17**



**Bosque**

**Nivel 16**



**Bosque**



**Luna**



**Luna**



**Luna**

# AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

**Nivel 15**



**Bosque**

**Nivel 14**



**Bosque**

**Nivel 13**



**Bosque**



**Luna**



**Luna**



**Luna**

# AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

**Nivel 12**



**Bosque**

**Nivel 11**



**Bosque**

**Nivel 10**



**Bosque**



**Luna**



**Luna**



**Luna**

# AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 09



Bosque

Nivel 08



Bosque

Nivel 07



Bosque



Luna



Luna



Luna

# AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

**Nivel 06**



**Bosque**

**Nivel 05**



**Bosque**

**Nivel 04**



**Bosque**



**Luna**



**Luna**



**Luna**

# AVANCE FOTOGRÁFICO DEPARTAMENTOS

Nivel 03



Bosque

Nivel 02



Bosque

Nivel 01



101



Luna



Luna



102
